



Configurazione elettrica Tier-1

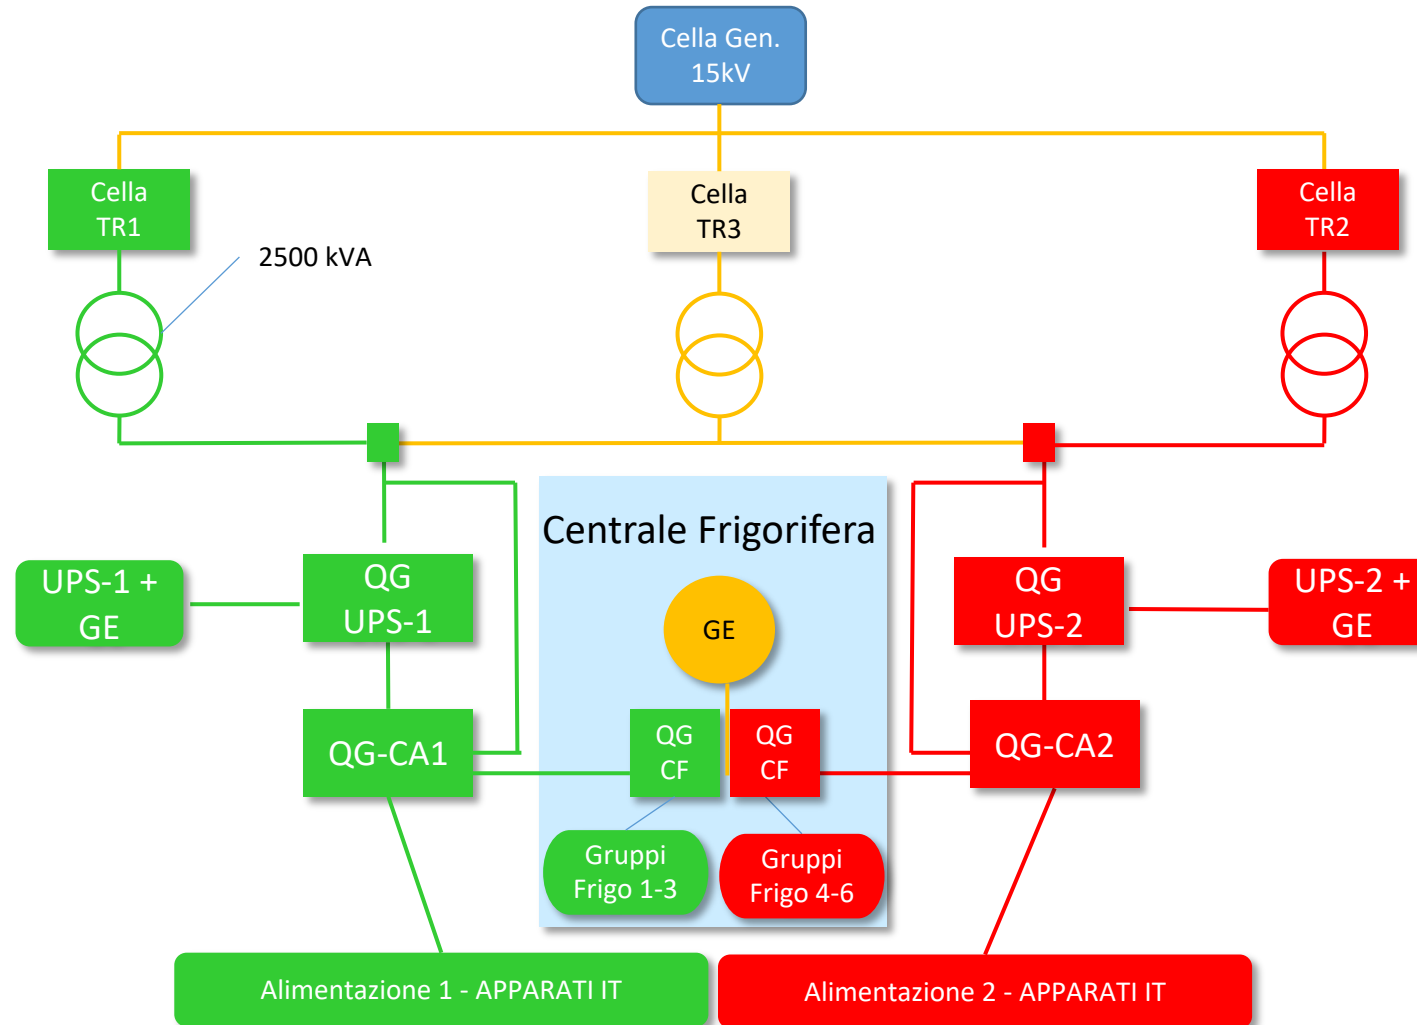


Intervento linea verde 22/03 – 24/03

Sostituzione tratto blindosbarra 4000 A nel tratto Sala trasformatori → Sala quadri

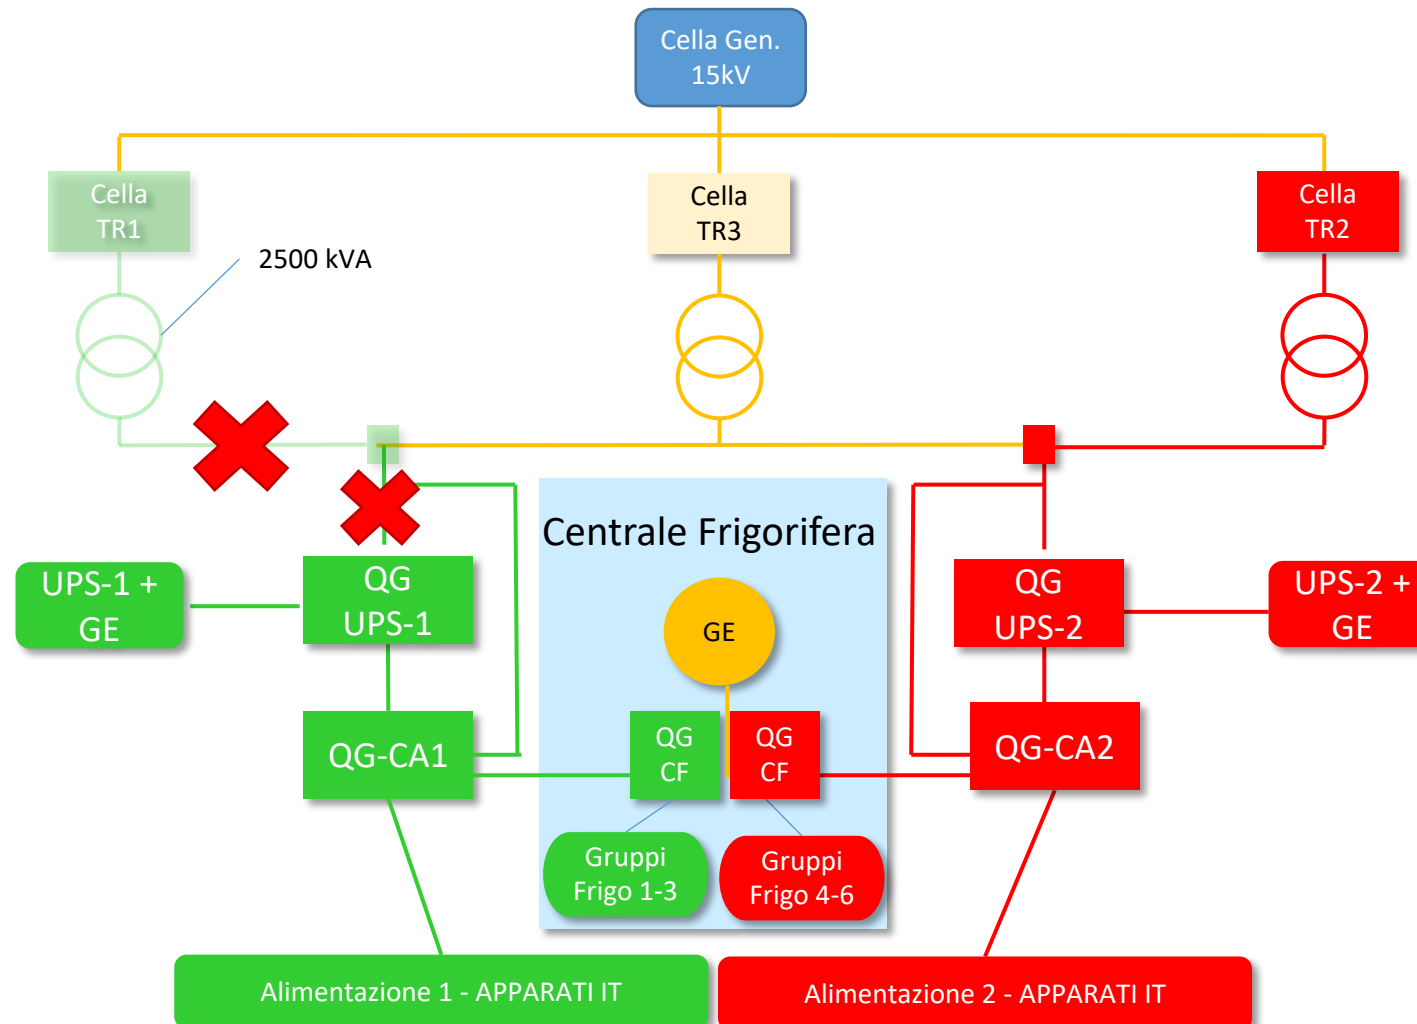


Intervento linea verde 22/03 – 24/03

configurazione diurna (09:00 – 18:00 ca.)

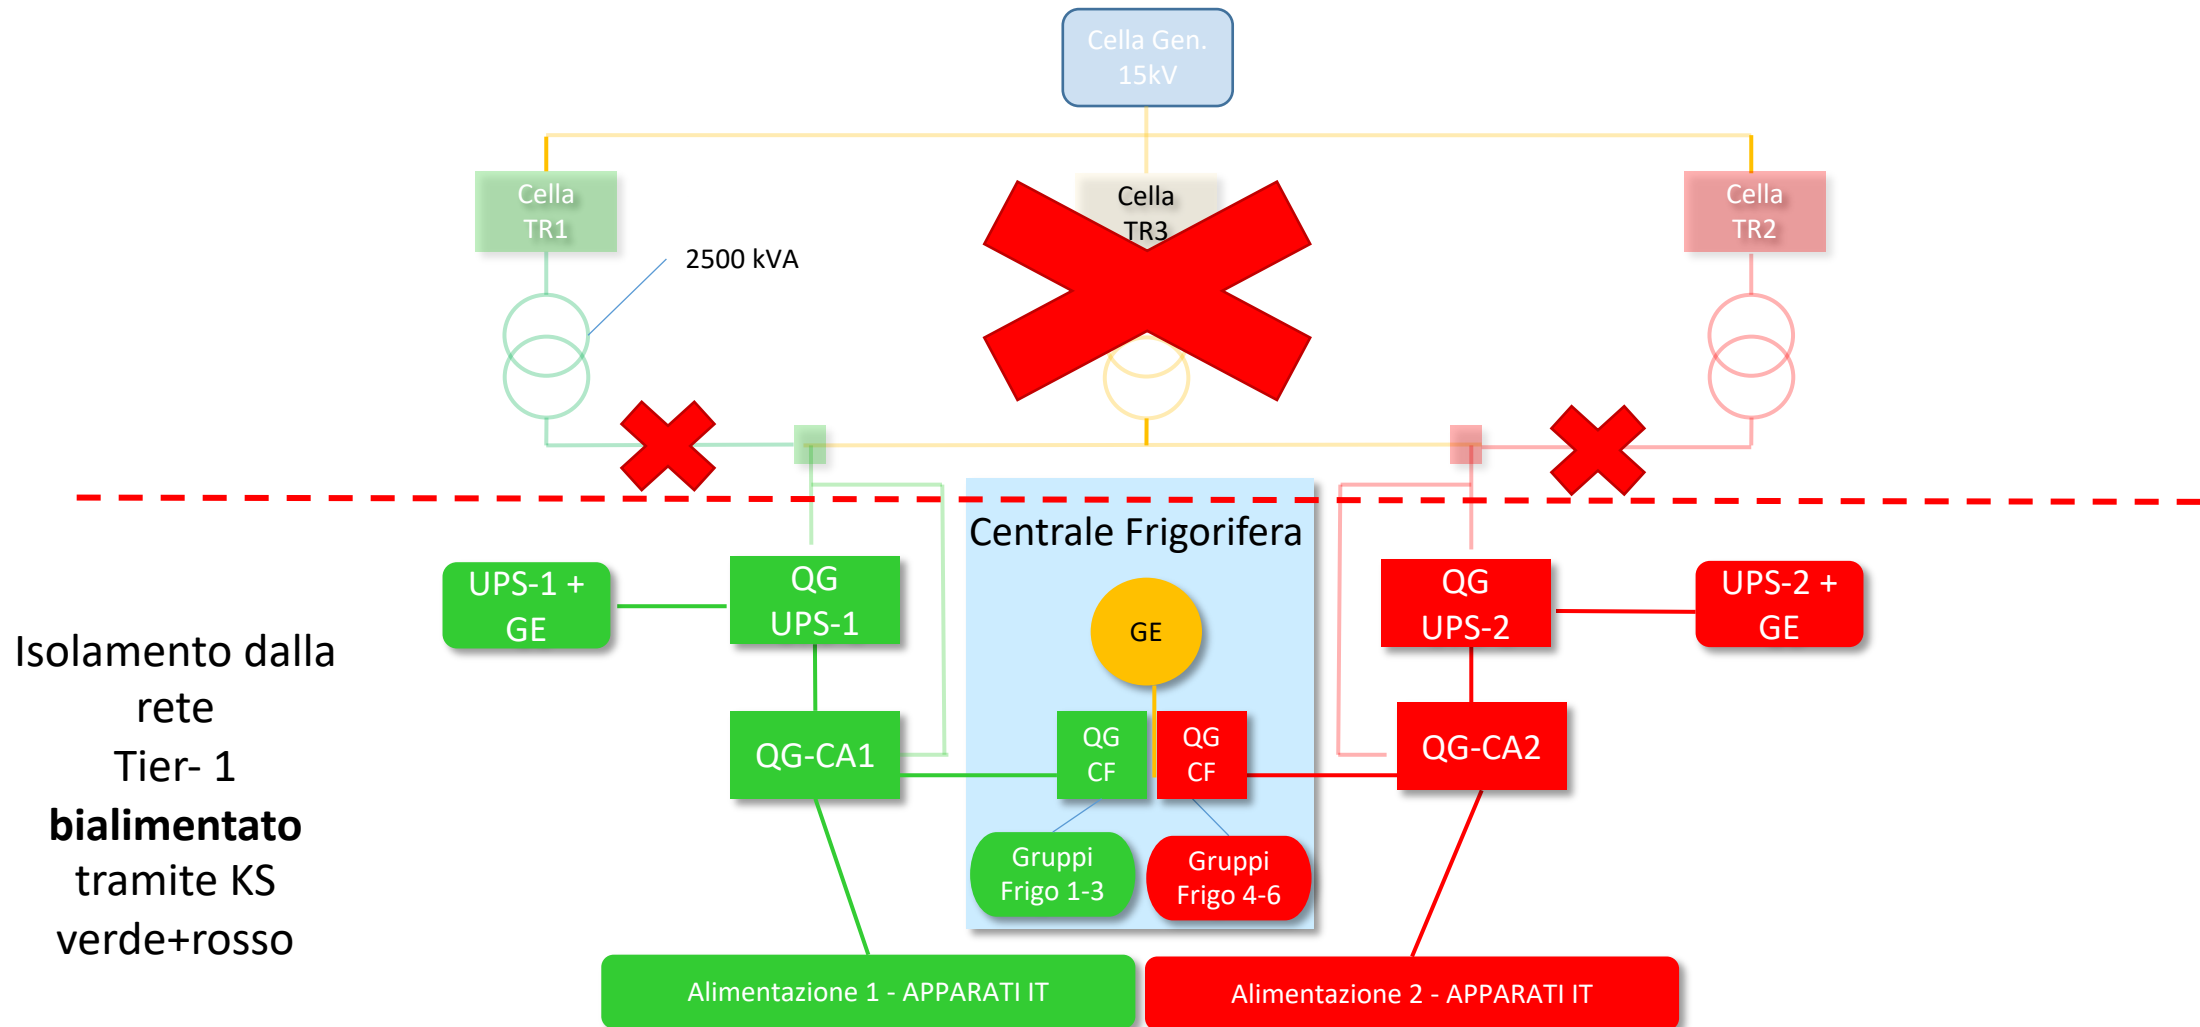

Intervento linea verde 22/03 – 24/03


configurazione notturna (18:00 – 09:00 ca.)

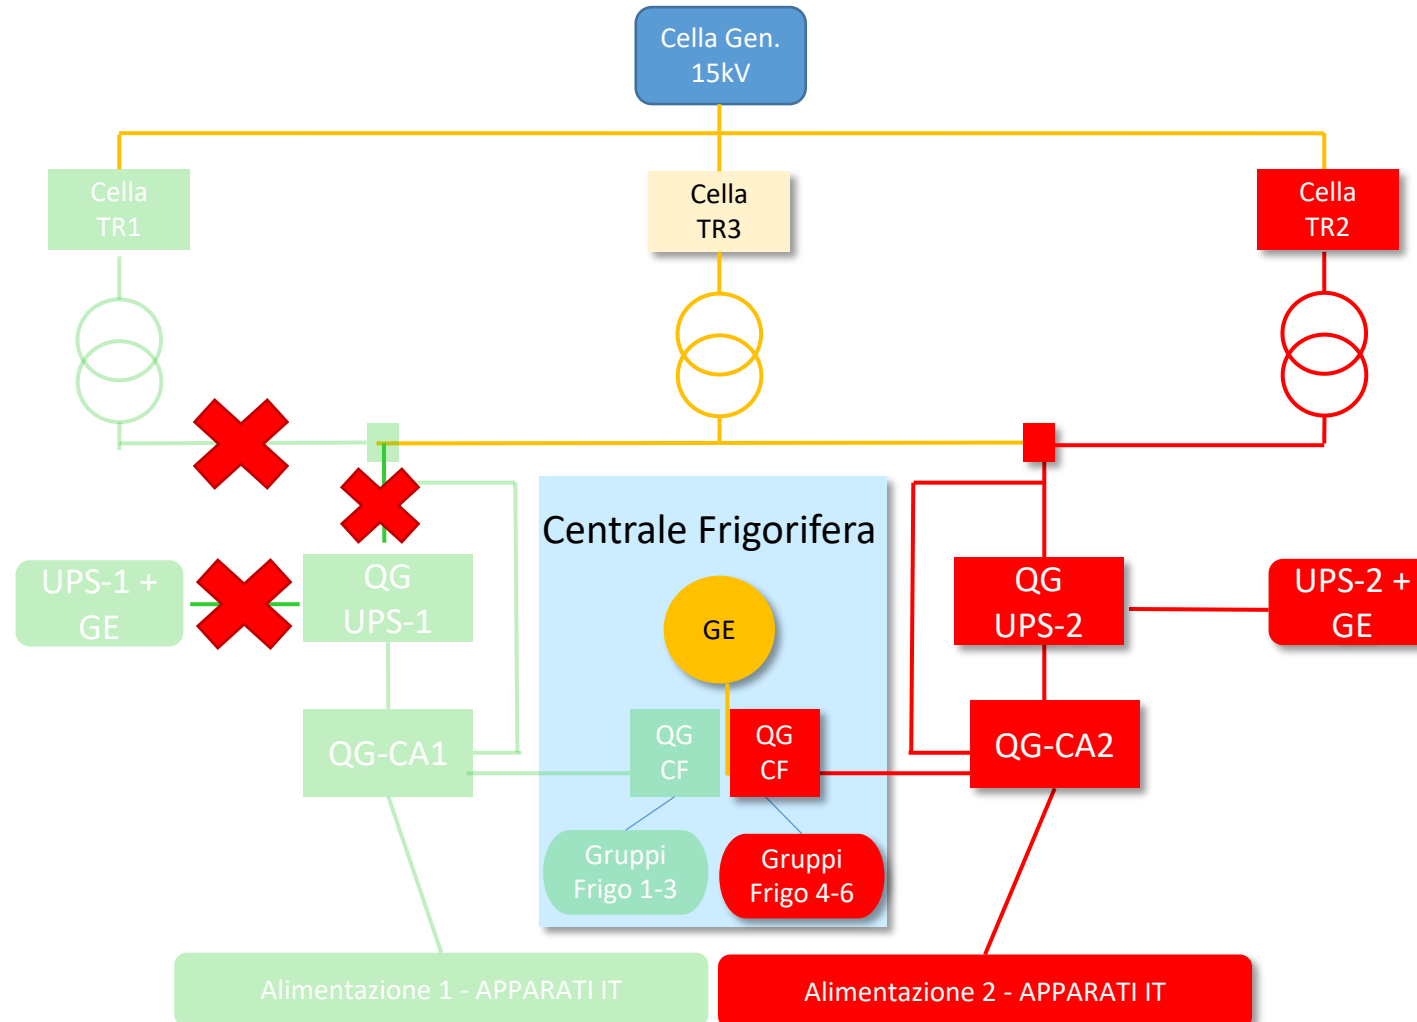

Tier- 1
monoalimentato
in continuità
assoluta LINEA
ROSSA


Intervento linea rossa 29/03 – 31/03

Sostituzione tratto blindosbarra 4000 A nel tratto Sala trasformatori → Sala quadri

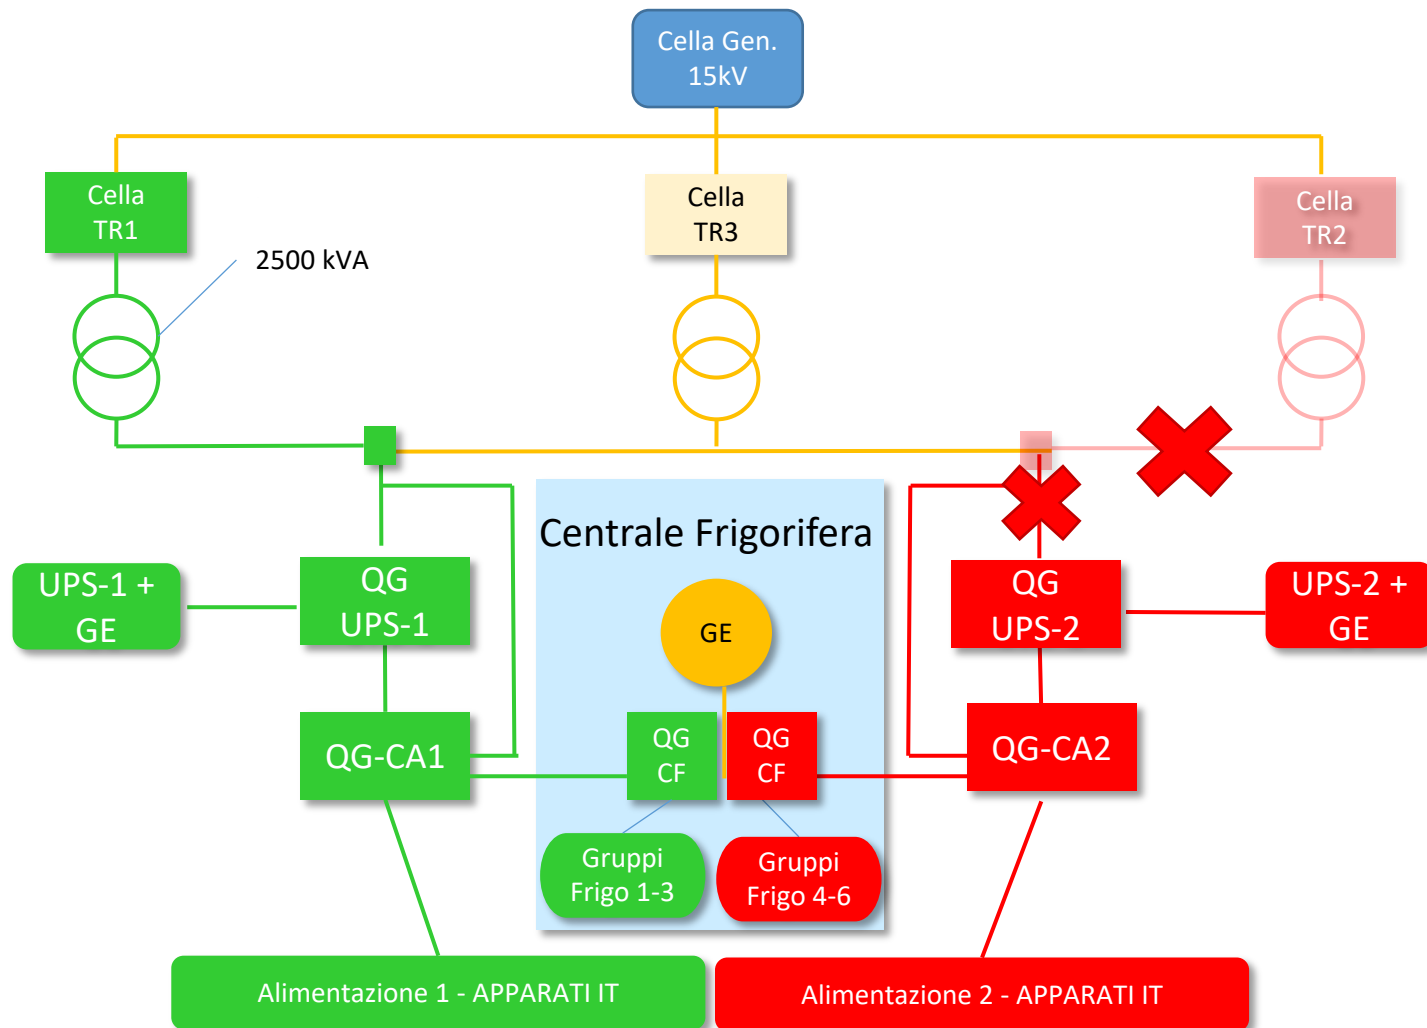

Intervento linea rossa 29/03 – 31/03


configurazione diurna (09:00 – 18:00 ca.)

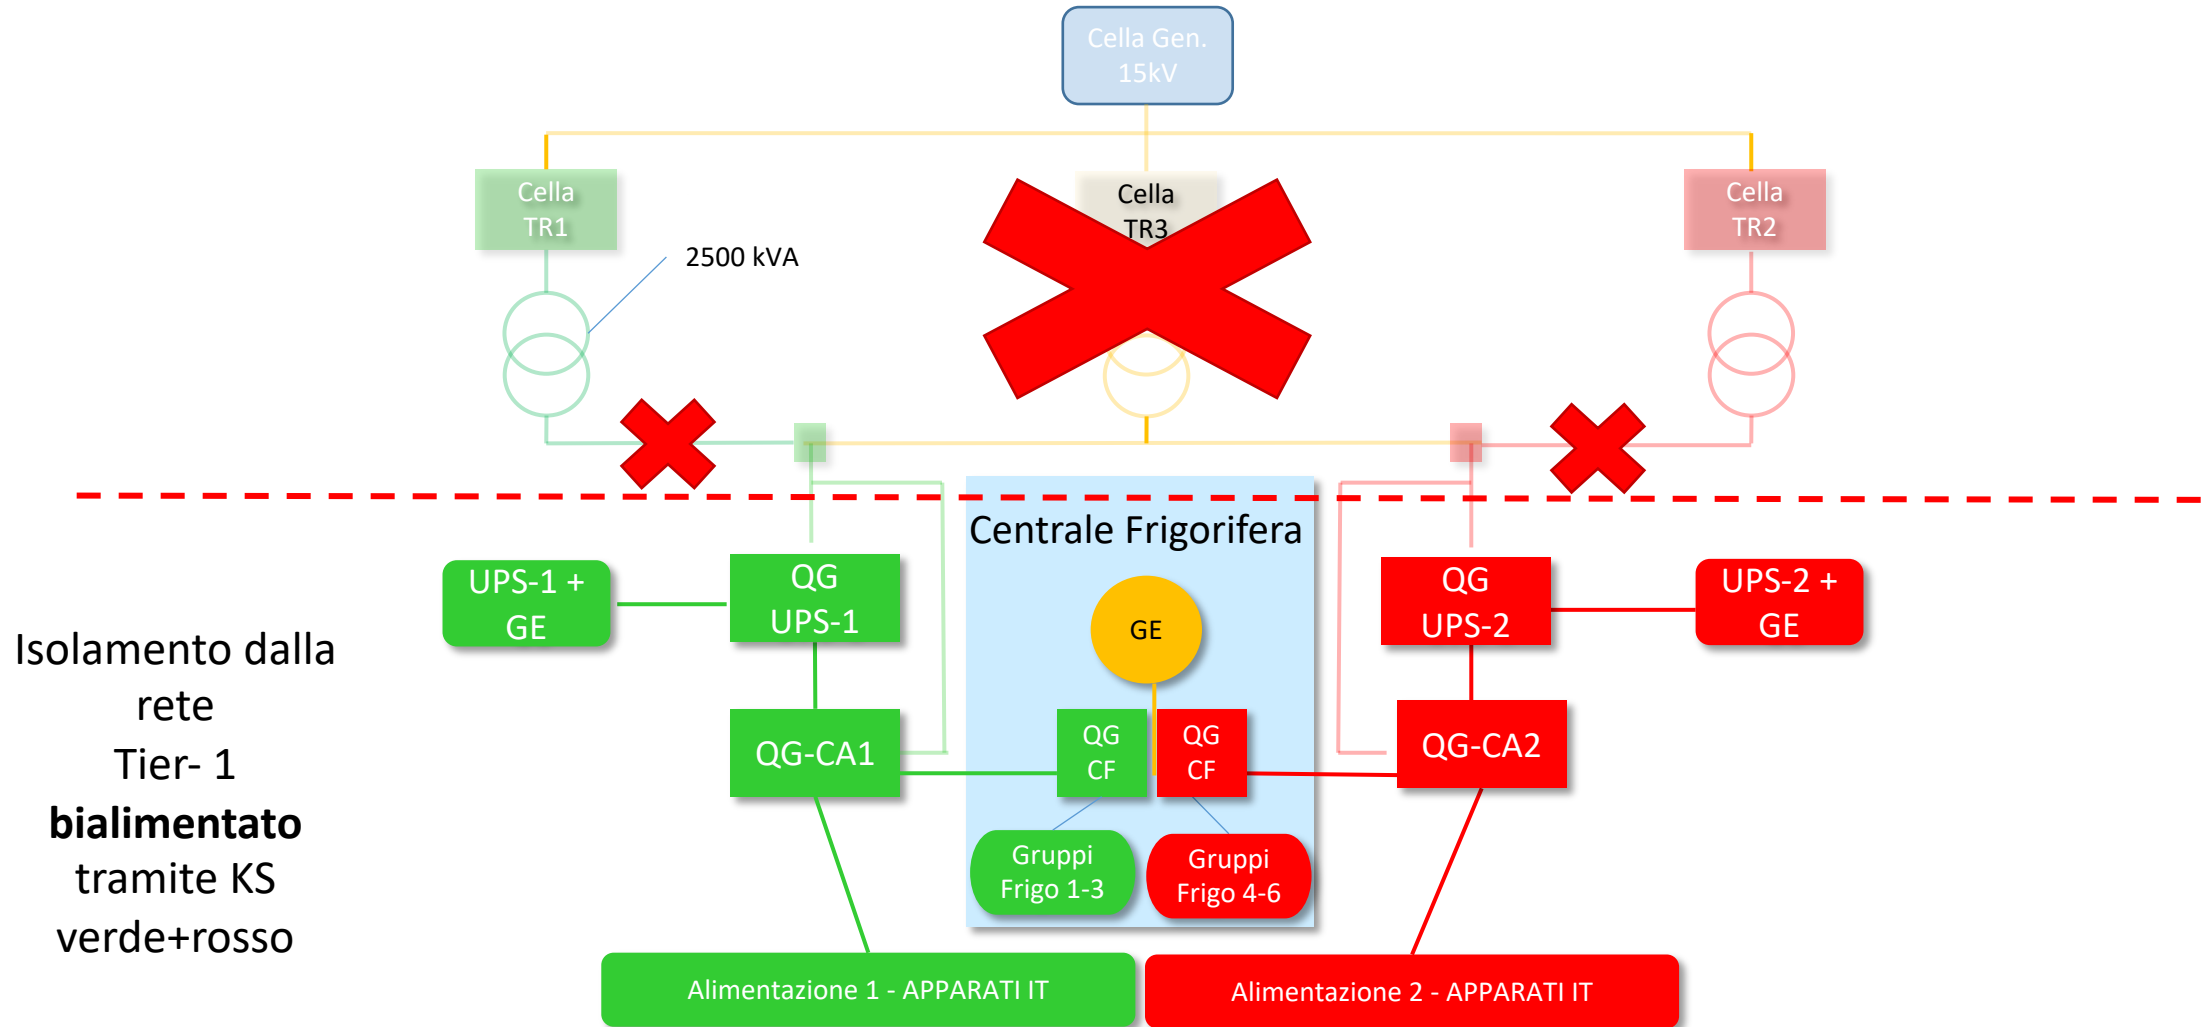

Intervento linea rossa 29/03 – 31/03

configurazione notturna (18:00 – 09:00 ca.)

Tier- 1
monoalimentato
in continuità
assoluta LINEA
VERDE

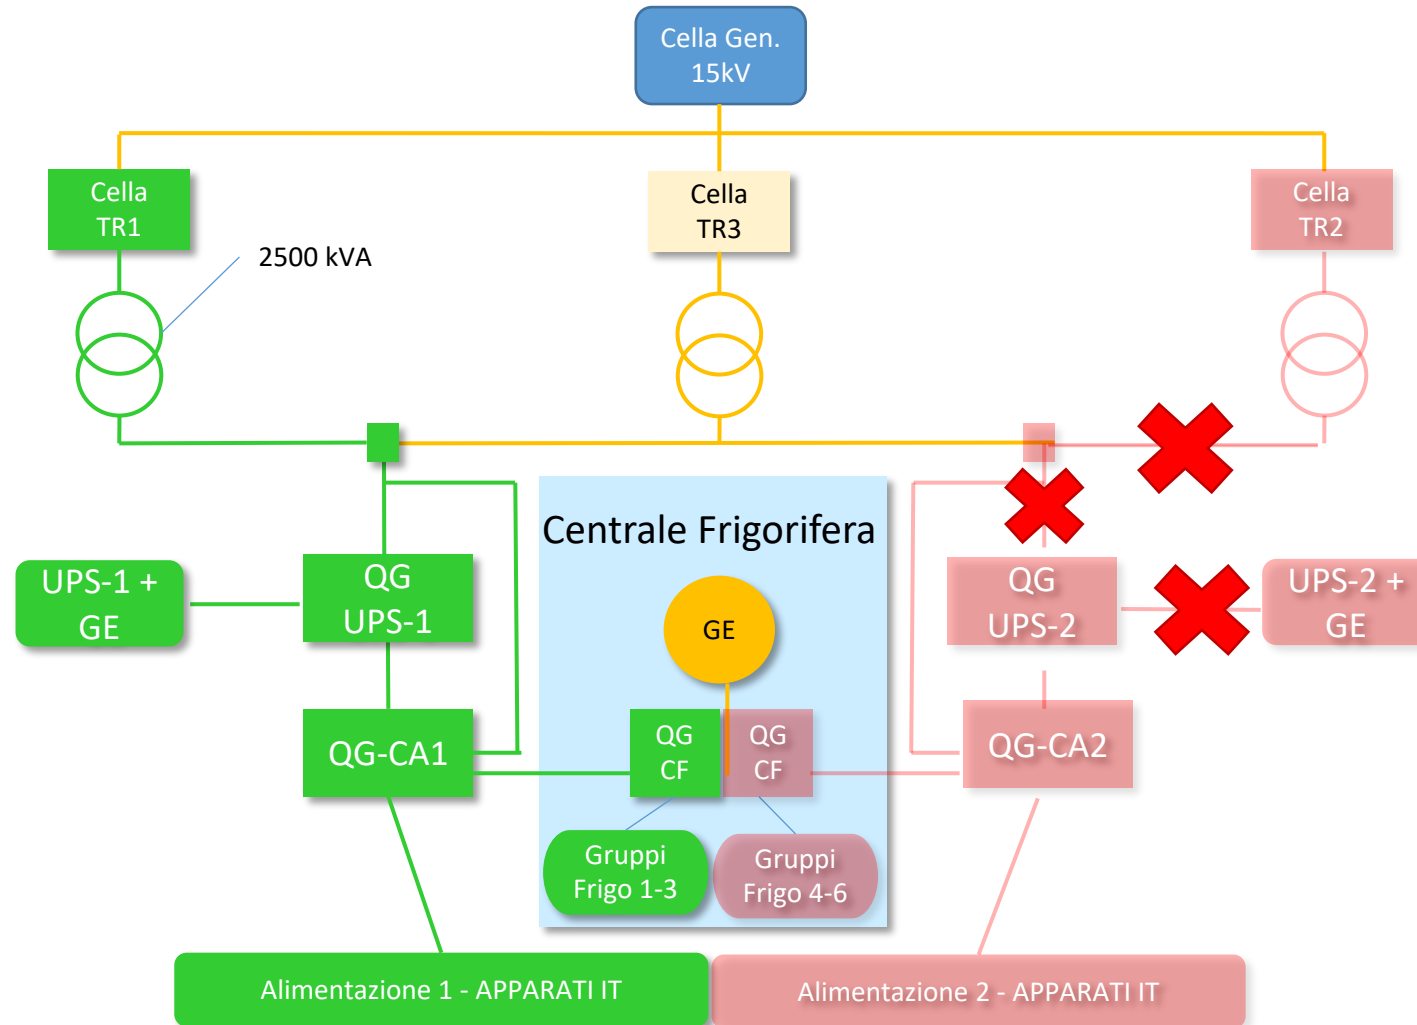

Criticità

- Intervento settimane 22/3 e 29/3 (3-4 giorni)
- Orario notturno metà gruppi frigoriferi spenti (3/6)
 - Carico IT ≈ 600 kW
 - $Q_f \approx 800$ kW (temperatura ambiente bassa)
- Carichi IT monoalimentati \rightarrow PDU/alimentatori più sollecitati
- In-row e CDZ di sala rimarranno tutti accesi

Avvertiti tutti i referenti di esperimento

At RISK su GOCDB
