



Interventi per ristrutturazione locali VIP & LIME

– Sala E –

Riunione di coordinamento

AGGIORNAMENTO N.4

L. Leonzi

20 OTTOBRE 2021




Ordine del Giorno:

- Attività eseguite e concluse
- Avvio lavori elettrici e rete dati
- Schedula attività in corso e attività future
- Questioni Aperte
- Budget
- Cronoprogramma generale

Attività eseguite e concluse

– Lavori edili

- Concluse le attività di finitura del vano scale
- Installazione porta doppia anta esterna al Piano Terra LIME
- Installazione apertura a spinta certificate per porta esterna PT VIP, porta esterna PT LIME, porta esterna PP LIME
- Sono state cambiate le serrature di tutte le porte

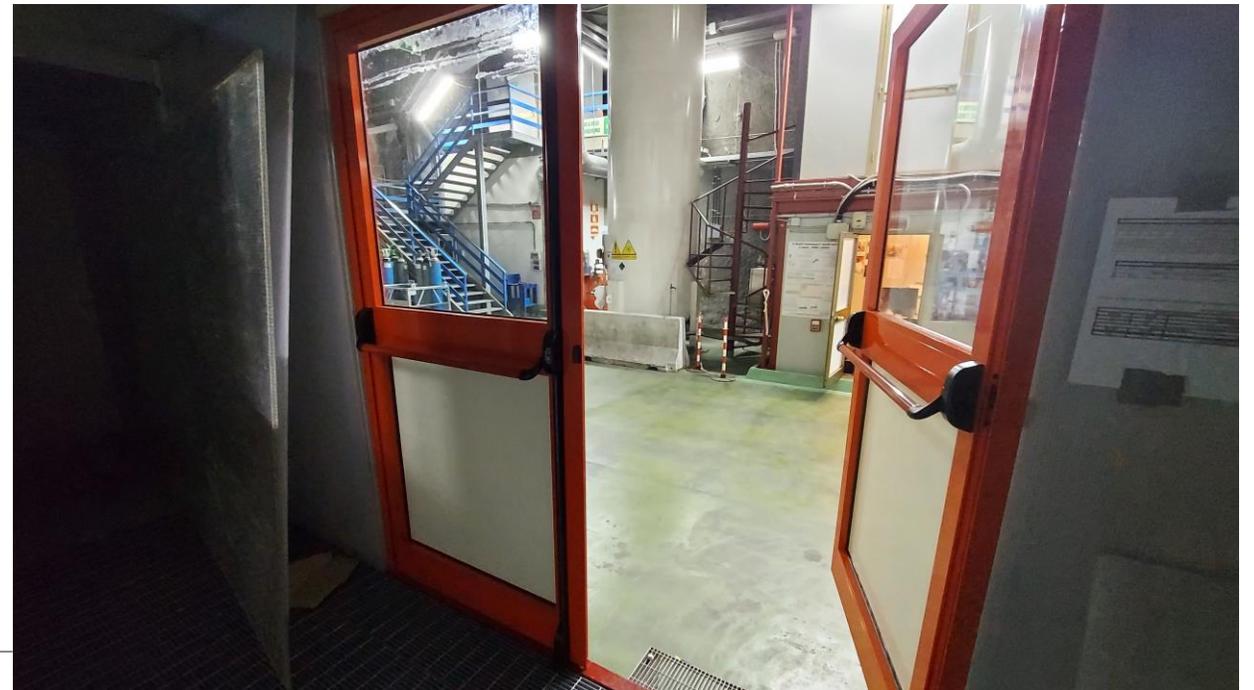

Lavori Edili – attività in corso:

- Posa pannelli policarbonato al Piano Terra LIME
- Installazione gradino esterno per VIP e LIME al piano terra
- Installazione porta interna scorrevole PT LIME



NOTA: Fine lavori edili
prevista per il 29 ottobre

Decisioni prese: interventi elettrici

- Installazione di un quadro generale linea normale (VIP e LIME) + Quadro Normale CR LIME + Quadro Normale CR VIP
- Installazione di un quadro generale linea continuità UPS (VIP e LIME) + Quadro UPS CR LIME + Quadro UPS CR VIP
- Installazione di canaline, prese e cavi
- Illuminazione con plafoniere LED + illuminazione di emergenza

Decisioni prese: interventi Rete dati

- 2 x Fibra ottica multimodo 6 cavi 50/125 LCLC (VIP e LIME)
- 1 x Rack 8 Unità (solo VIP, LIME installerà lo switch in un proprio rack)
- 2 x 8 prese PT + 2 x 8 prese PP (VIP e LIME)
- Cavi cat. 6A

Schedula:

Attività in corso

- Approvvigionamento materiali elettrici e rete dati da parte di OMNIA
- Siamo in attesa di ricevere il preventivo da OMNIA per le attività relative al condizionamento dei locali e linea + pannello di gestione aria compressa

Schedula prossime attività

- 08-19 nov. 2021 - lavori elettrici + rete dati + prese telefoniche per PT e PP LIME + PT e PP VIP
- Dicembre - lavori per condizionamento locali VIP/LIME e installazione pannello gestione aria compressa

Questione Aperta:

E' necessario individuare una ditta che possa fornire il servizio di smaltimento della miscela gas He-CF₄ e eventualmente relativa fornitura di bombole vuote in comodato d'uso, altrimenti quest'ultime dovranno essere acquistate a parte.

ORGANIGRAMMA

Esperimento LIME

- Spokesperson: E. Baracchini, D. Pinci
- Coordinatore tecnico: G. Mazzitelli
- Responsabile Locale: E. Baracchini
- GLIMOS: G. Mazzitelli
- RAE: G. Mazzitelli

Esperimento VIP

- Spokesperson: C. Curceanu
- Coordinatore tecnico: A. Clozza
- Responsabile Locale: M. Laubenstein
- GLIMOS: A. Clozza
- RAE: A. Clozza

BUDGET (da completare)

ATTIVITA'	Resp. Attività	STIMA COSTI	COPERTURA FONDI
IVA inclusa			
Lavori edili per la ristrutturazione e adeguamento del box	Martella	24.650,00 €	LIME
Lavori per l'installazione dell'impianto elettrico e rete dati	Cappelli/Parlati	30.000,00 €	LNGS Direzione
Installazione di nuovi impianti (aria compressa, condizionamento) e manutenzione impianti esistenti	Bucciarelli	tbd	LIME
Installazione di sensori (ossigeno e rilevatore fumo)	Bucciarelli	15.860,00 €	LIME
TOTALE		70.510,00 €	

NOTE: Gli importi individuati potrebbero subire dei cambiamenti con il rendiconto consuntivo

CRONOPROGRAMMA generale delle principali attività:

- Ottobre 2021 → Fine lavori edili
- Novembre 2021 → installazione impianto elettrico e rete dati (Cappelli, Parlati)
- Dicembre 2021 → manutenzione impianto di condizionamento esistente VIP e LIME, installazione nuovo fan coil PP LIME, installazione nuovo fan coil PP VIP (Bucciarelli)
- Dicembre 2021 → installazione linea + pannello gestione aria compressa LIME (Bucciarelli)
- Marzo 2022 → installazione sensori ossigeno e rilevatori fumo (Bucciarelli)

NOTE:

→ I tempi possono variare in funzione dei procedimenti amministrativi e disponibilità ditte
