



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	aperta	Cogenerazione UNIBA	868.090,00 €		898.913,77 € iva al 10%	04/12

1 RUP Bonsegna. Gara chiusa il 4 dicembre 2020.

Nel CDA del 29.07.2021 la gara è stata aggiudicata in maniera definitiva alla ditta

Siram SpA

Codice Fiscale 08786190150

- con 1% di ribasso e un trigeneratore da 435 kW.
- La Siram è una ditta già nota ad UNIBA in quanto si è occupata di tutta l'alimentazione del Policlinico (GE, etc)
- Attualmente è in fase di definizione il contratto.
 - Era stato promesso per la metà di ottobre:
 - si pensa che sarà completato per la fine di ottobre



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	aperta	Cogenerazione UNIBA	868.090,00 €		898.913,77 € iva al 10%	04/12

- Dopo circa una 20ina di giorni (un mese) sarà consegnato il cantiere
- Sono stati avviati contatti con la **Siram SpA** per prendere accordi su alcune lavorazioni da effettuare nella sala server (come l'installazione installazione di due CRAC)
 - preoccupazione riguardo alla possibilità di generare polvere nel sottopavimento, quindi nel circuito dell'aria di raffreddamento
 - preoccupazione circa la possibilità di dover prevedere una interruzione delle operazioni di ReCaS-Bari
- I tempi di consegna previsti dal capitolato sono di 8 mesi
 - completamento a luglio 2022 - collaudo ad agosto 2022 - pagamento settembre 2022

Procedure in Corso - UNIBA- Budget



N	Bene	descrizione fornitura	Somma assentita (€)	Base di gara (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Con (10%) (€)
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	Cogenerazione	868.090,00	800.962,68	16.231,66	817.194,34	898.913,77
			Ribasso offerto (%)	importo offerto (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Con IvA (10%) (€)
			1%	792.953,05	16.231,66	809.184,71	890103,18
		Somma assentita - Costo		- 22.013,18			

- Con mail del 21 giugno 2021 è stato richiesto di modificare gli importi assentiti in questo modo (il massimo possibile entro il 5%):
 - BA-15-IMP-UNIBA € 143.510,00 + € 7000,00= € 150.510, 00
 - BA-17-IMP-UNIBA € 724.580,00 + € 36000,00 = € 760.580,00
 - per un totale di € 911090,00 (con un extra budget di € 20986,82).
- **Tale modifica non è stata possibile effettuarla**



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-20-CAL-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA	aperta	CPU e Rete UNIBA	476.790,00 €		476.790,00 €	30/11

- 1 RUP Napolitano. La gara si è chiusa il 30 novembre 2020.
Nel CDA del 29.07.2021 la gara è stata aggiudicata in maniera definitiva alla ditta
I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L.
 - con 24,244% di ribasso
 - Attualmente è in fase di definizione il contratto.
 - Era stato promesso per la metà di ottobre:
 - Si pensa che sarà invece completato per la fine di ottobre

Procedure in Corso - UNIBA- Budget



N	Bene	descrizione fornitura	Somma assentita (€`)	Base di gara (€`)	Oneri per la sicurezza (€`)	Totale (€`)	Co (22%) (€`)
1	BA-20-CAL-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA	server con e senza GPU. rete infiniband	476.790,00	390.591,47	220,00	390.811,47	476.790,00
			Ribasso offerto (%)	importo offerto (€`)	Oneri per la sicurezza (€`)	Totale (€`)	Con IvA (22%) (€`)
			24,244%	303.708,30	220,00	303.928,30	370.792,53
		Somma assentita - Costo		105.997,47			

Procedure in Corso - UNIBA

- Sempre con mail del 21 giugno 2021 è stato richiesto di diminuire gli importi assentiti di una percentuale leggermente inferiore al 10%.
 - BA-22-NET-UNIBA lasciare invariato a € 16.010,00
 - BA-28-CAL-UNIBA diminuire di € 22.730,00 (circa il 9,62%) l'importo assentito pari a € 236.120,00
 - Il nuovo importo assentito diventa perciò € 213.390,00
 - BA-20-CAL-UNIBA diminuire di € 21.620,00 (circa il 9,62%%).l'importo assentito pari a € 224.660,00
 - Il nuovo importo assentito diventa perciò € 203.040,00
 - La riduzione sui due importi è di $€ 22.730,00 + € 21.620,00 = € 44.350,00$ compensando esattamente le variazioni in più sulle due gare impianti.
- **Tale modifica non è stata possibile effettuarla**




Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-19-STO-UNIBA	aperta	Tape Library	651.700,00 €		651.700,00 €	

- RUP Napolitano
- I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti da tempo
 - è pervenuta una sola offerta dalla ditta RiccaIT
- è in fase di costituzione la commissione (che sarà la stessa della gara server: Domenico di Bari, Michele Perniola, Maria Teresa De Fazio).
 - Il decreto di nomina è stato sottoposto alla firma lunedì scorso.
- Il fatto che sia pervenuta una sola offerta dovrebbe semplificare le operazioni di gara
 - Assegnazione provvisoria entro novembre 2021
 - assegnazione definitiva entro dicembre 2021
 - Consegna materiali entro marzo 2022
 - collaudo entro aprile 2022
 - pagamento a maggio 2022

Creazione dell'ambiente in cui installare la tape library

I lavori (a rilento) stanno procedendo.

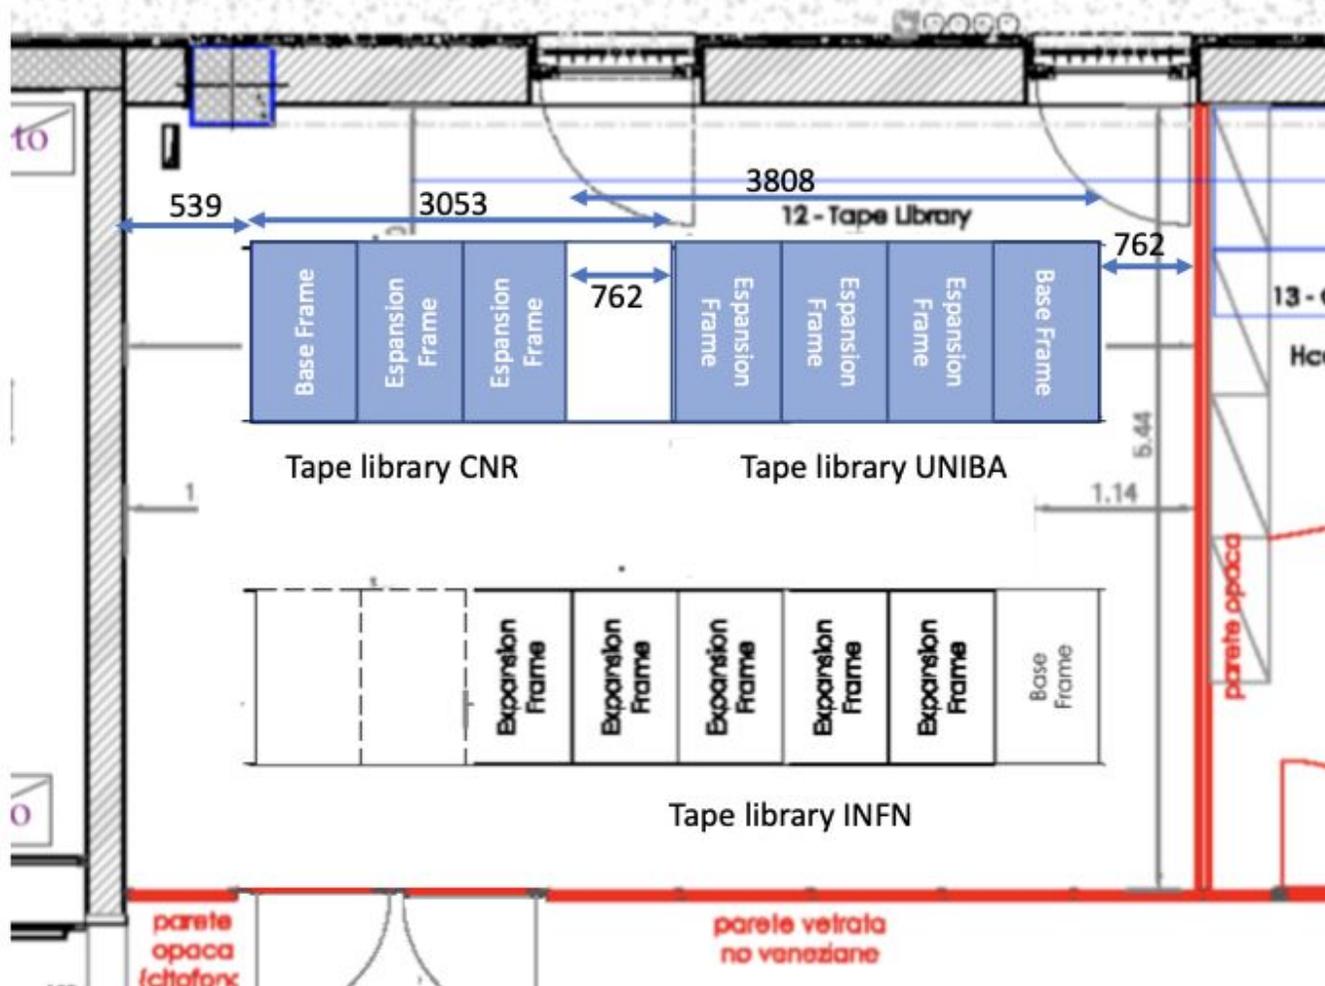



Procedure in corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-21-NET-UNIBA	MEPA/Consip	Rete LAN e MAN	146.670,00 €			

1 RUP Napolitano

- Pubblicato l'RDO su MEPA (ordine di 120.221,00 € + IVA,)
- sono state invitate 5 ditte,
- I tempi per la presentazione delle offerte sono ormai scaduti
- Si sta nominando la commissione per l'esame della offerta tecnica
 - La commissione che si riunisce domani alle ore 11:00
- A causa dei problemi di approvvigionamento delle materie prime, i 45 gg previsti per la consegna del materiale sono stati allungati a 75 gg
- Ma a giudicare dai quesiti presentati sembra che neppure 75 gg siano sufficienti



Procedure in fase di avvio - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita (*)	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
2	BA-16-IMP-UNIBA	Aff. diretto/ MEPA	Impianto spegnimento incendi sala UPS	28.570,00			

2. RUP Bonsegna.

- È stato messo a punto il capitolato che ora è in fase di approvazione (RUP, INFN, ReCaS)
 - Una volta ottenuta una approvazione di massima si potrà richiedere il DUVRI
- In questo momento non c'è budget disponibile.
 - Sarà riassegnato all'inizio dell'anno prossimo
 - Si sta verificando se è possibile ottenerlo in prestito
- (*) Sempre con Mail del 21 giugno 2021 è stato chiesto di aumentare la somma assentita per questo acquisto di € 1.350,00 (meno del 5 %) portando la somma assentita a € 28.570,00.
- Questa gara, come quella precedente, è tutta gestita del DIF (non sono coinvolti organi e uffici centrali di UNIBA)



Procedure concluse e rendicontate - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-02-CAL-INFN	consip	Server BA	96.620,00 €	92.250,00 €	92.241,76 €	- 8,24 €	8	OK
2	BA-14-NET-INFN	RdO	Switch BA	28.7060,00 €	26.700,00 €	25.803,00 €	- 897,00 €	8	OK
						118.044,76 €	- 905,24 €		



Procedure concluse e rendicontate - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-03-IMP-INFN	RdO	rack	€ 35.140,00		36.135,18			
2	BA-04-IMP-INFN	RdO	PDU	€ 21.870,00		22.082,00			
						0,00 €	- 0,00 €		

- Montaggio dei rack lunedì 19 aprile 2021
- Pagamento fatture tra maggio e giugno 2021
- Rendicontazione a giugno 2021

- **Procedura conclusa**

Procedure in corso - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
1	BA-01-CAL-INFN BA-06-CAL-INFN	L1 L2	CPU HTC CPU Cloud	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.290.337,285€ 368.055,77€	29.963€ 81.265€		
1	Approvata delibera 12805 del 27/05/2021 agg. ITD Solution (Lotto 1) ITM (Lotto 2)								

- Lotto 1 - bene BA-01-CAL-INFN
- (30 enclosure per HTC, 4 unità per enclosure)
- CIG 83527771A3
- base di gara 1.320.299,99
- aggiudicato a ITD per 1290337,28
- STATO: contratto in stipula (contratto inviato, la ditta deve firmare)

- Lotto 2 - bene BA-06-CAL-INFN
- (6 unità con 112 core e 2 GPU ciascuna)
- CIG 835282486A
- base di gara 449320
- aggiudicato a ITM per 368055,77
- STATO: contratto in bozza, verrà inviato il 20 ottobre da AC alla ditta per la firma

- bene

BA-08-CAL-INFN

Procedure in corso - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
2	BA-08-STO-INFN	APERTA	STORAGE	1.352.740,00 €	1.352.740,00 €	815. 979,13 €	536.760,87		
2	Approvata delibera 12806 del 27/05/2021 agg. Sielte								

- Aggiudicata a Sielte con delibera GE 12806 del 27/05/2021
- Contratto pronto ed inviato alla ditta.
- Si attende firma azienda

Procedure in corso - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
3	BA-09-NET-INFN BA-29-NET-INFN	Comune aperta	Centro stella	€ 198.220,00 € 351.360,00					
	Le schede precedenti sono confluite nella BA-30-NET-INFN			€ 549.580,00		355.658,90 €	193.921,10		
3	L'assegnazione è stata approvata dalla Giunta. In attesa di contratto, non dovrebbe mancare molto. L'azienda è pronta a consegnare immediatamente dopo la firma del contratto.								

Procedure in corso - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-07-STO-INFN BA-11-STO-INFN	RdO RdO	Storage CEPH Storage SSD	154.800 € 111.260 €			
	Collassare le due schede precedenti in una singola scheda (variazione tipo C) da prendere su CONSIP			266.060 €			
2	BA-12-STO-INFN	Diretto	Metadata	46.970 €		46.023.28€	
3	BA-10-NET-INFN	Consip/ MEPA	Fortigate	€ 83.400,00			
1	La variazione di Tipo C è stata approvata da parte dell'ETS (Carlino), il materiale è stato consegnato Montaggio a Rack previsto per Giovedì 21 Ottobre						
2	l'acquisto è stato fatto attraverso convenzione Consip il materiale è stato consegnato, pagato ed è già messo in produzione.						
3	Variazione di tipo C approvata dall'ETS ma la convenzione CONSIP non è più attiva RDO MEPA pagamento marzo 2022						



Procedure in corso - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-05-IMP-INFN	RdO	UPS	167.840 €	€ 201.400,00		
1	La variazione di tipo C è stata approvata dall'ETS La somma assentita è stata variata da 167840,00 € a 201400,00 €						
	Uso del MEPA era già approvato dalla Giunta INFN con il vecchio CUI. La gara è stata bandita e il tempo a disposizione per la ricezione delle offerte è ormai chiuso È pervenuta solo l'offerta della Vertiv Seduta amm più soccorso istruttorio conclusi, si attende nomina commissione per fasi successive						
