


**CIF 06/06/2022**

## MEGANTE

- Progettazione flangia di testa;
- Progettazione struttura esterna;
- Definizione del tipo di smorzatori;
- Progettazione supporti e regolazioni linea da vuoto;
- Ricostruzione della struttura civile secondo quanto fornito dalla ditta incaricata , calcolo ingombri e valutazioni di possibili soluzioni di montaggio;

Croce Antonio



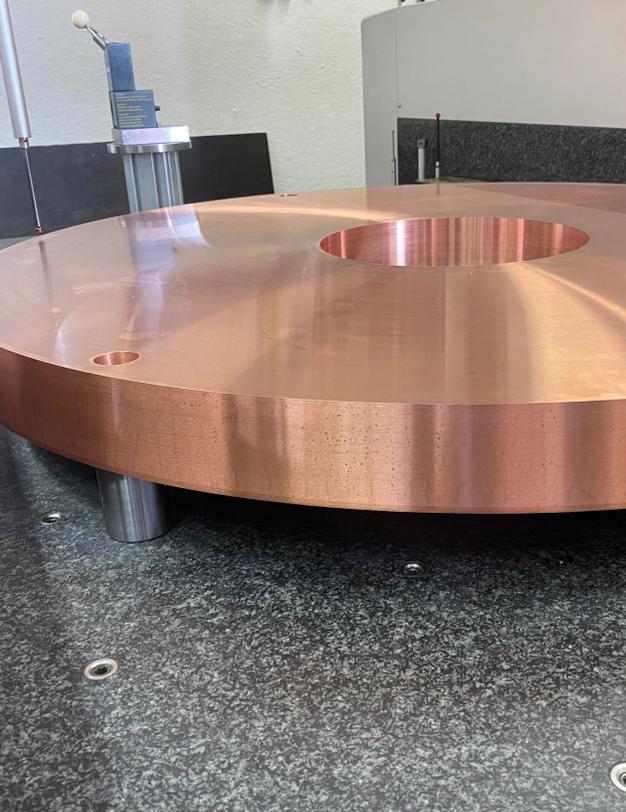


## MEGANTE



- Collaudo presso le officine DAL ZOTTO e RETTIFICA NORD del primo disco di rame.
- A sinistra possiamo vedere le fasi di misura nelle diverse posizioni.
- Sono state controllate tutte le tolleranze dimensionali e geometriche definite nel disegno costruttivo.
- Le misure si sono svolte in camera climatizzata su una CMM.

# ITK TOOL DI INTEGRAZIONE

- Studio e definizione di giochi e accoppiamenti necessari al montaggio;
- Realizzazione dei disegni esecutivi di tutti i componenti da realizzare nelle nostre officine;
- Ordine dei maschi sinistri M8 e delle teste sferiche, prelievo in magazzino di tutta la viteria per il montaggio.

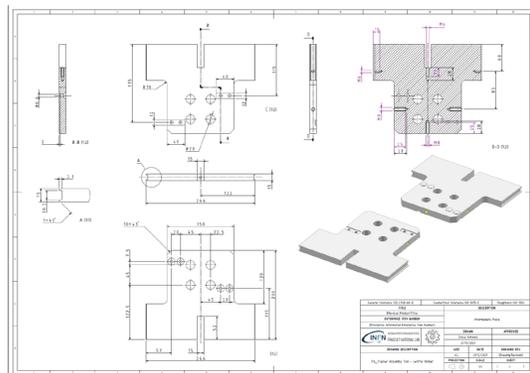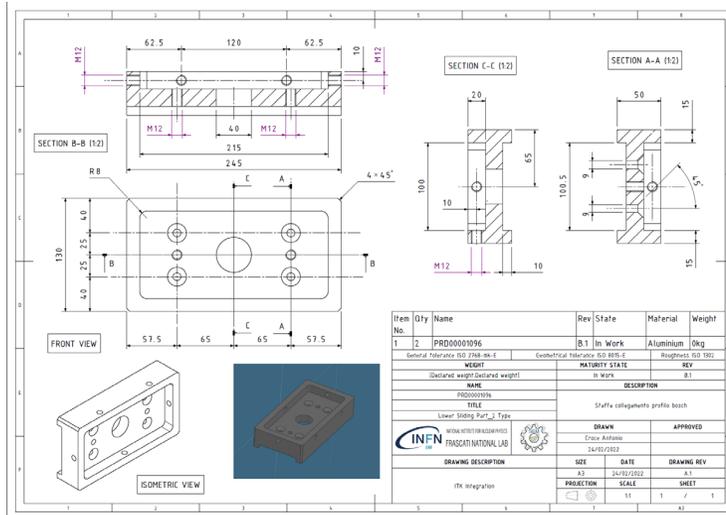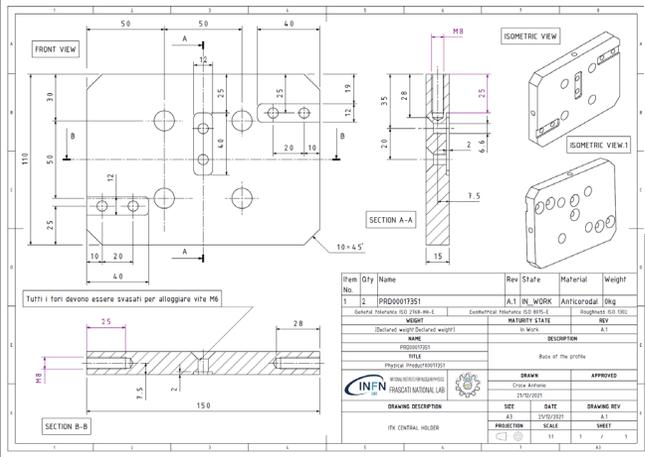

**Croce Antonio**

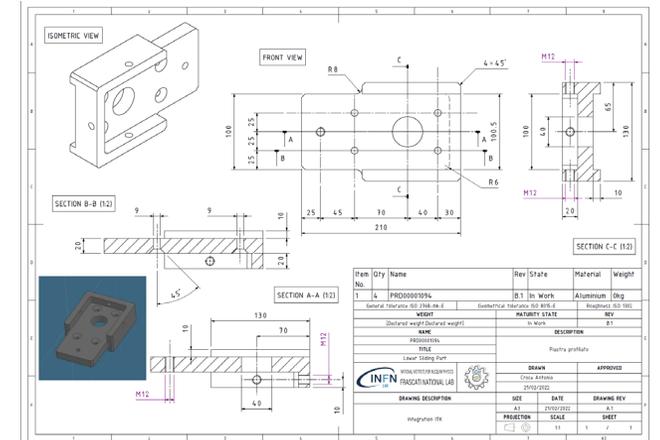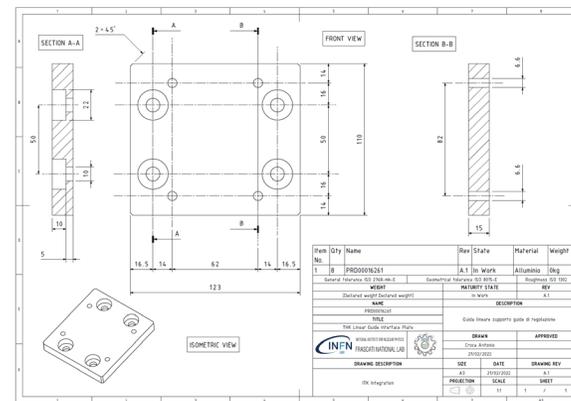





Tutti i lavori sono stati svolti  
con il nuovo software **3D EXPERIENCE**.



## ITK TOOL DI INTEGRAZIONE

- Montaggio della struttura su cui calettare i sottosistemi di seguito;
- Montaggio teste di regolazione e alloggiamento di esse sui profili Bosch;
- Montaggio sistemi di regolazione di base sui profili Bosch ,  
montaggio interfacce e delle guide lineari.

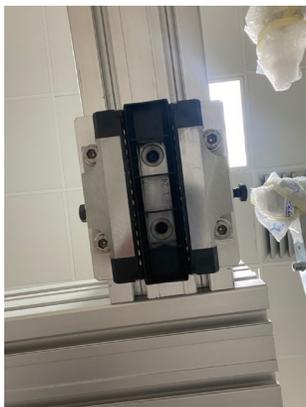

**Croce Antonio**

