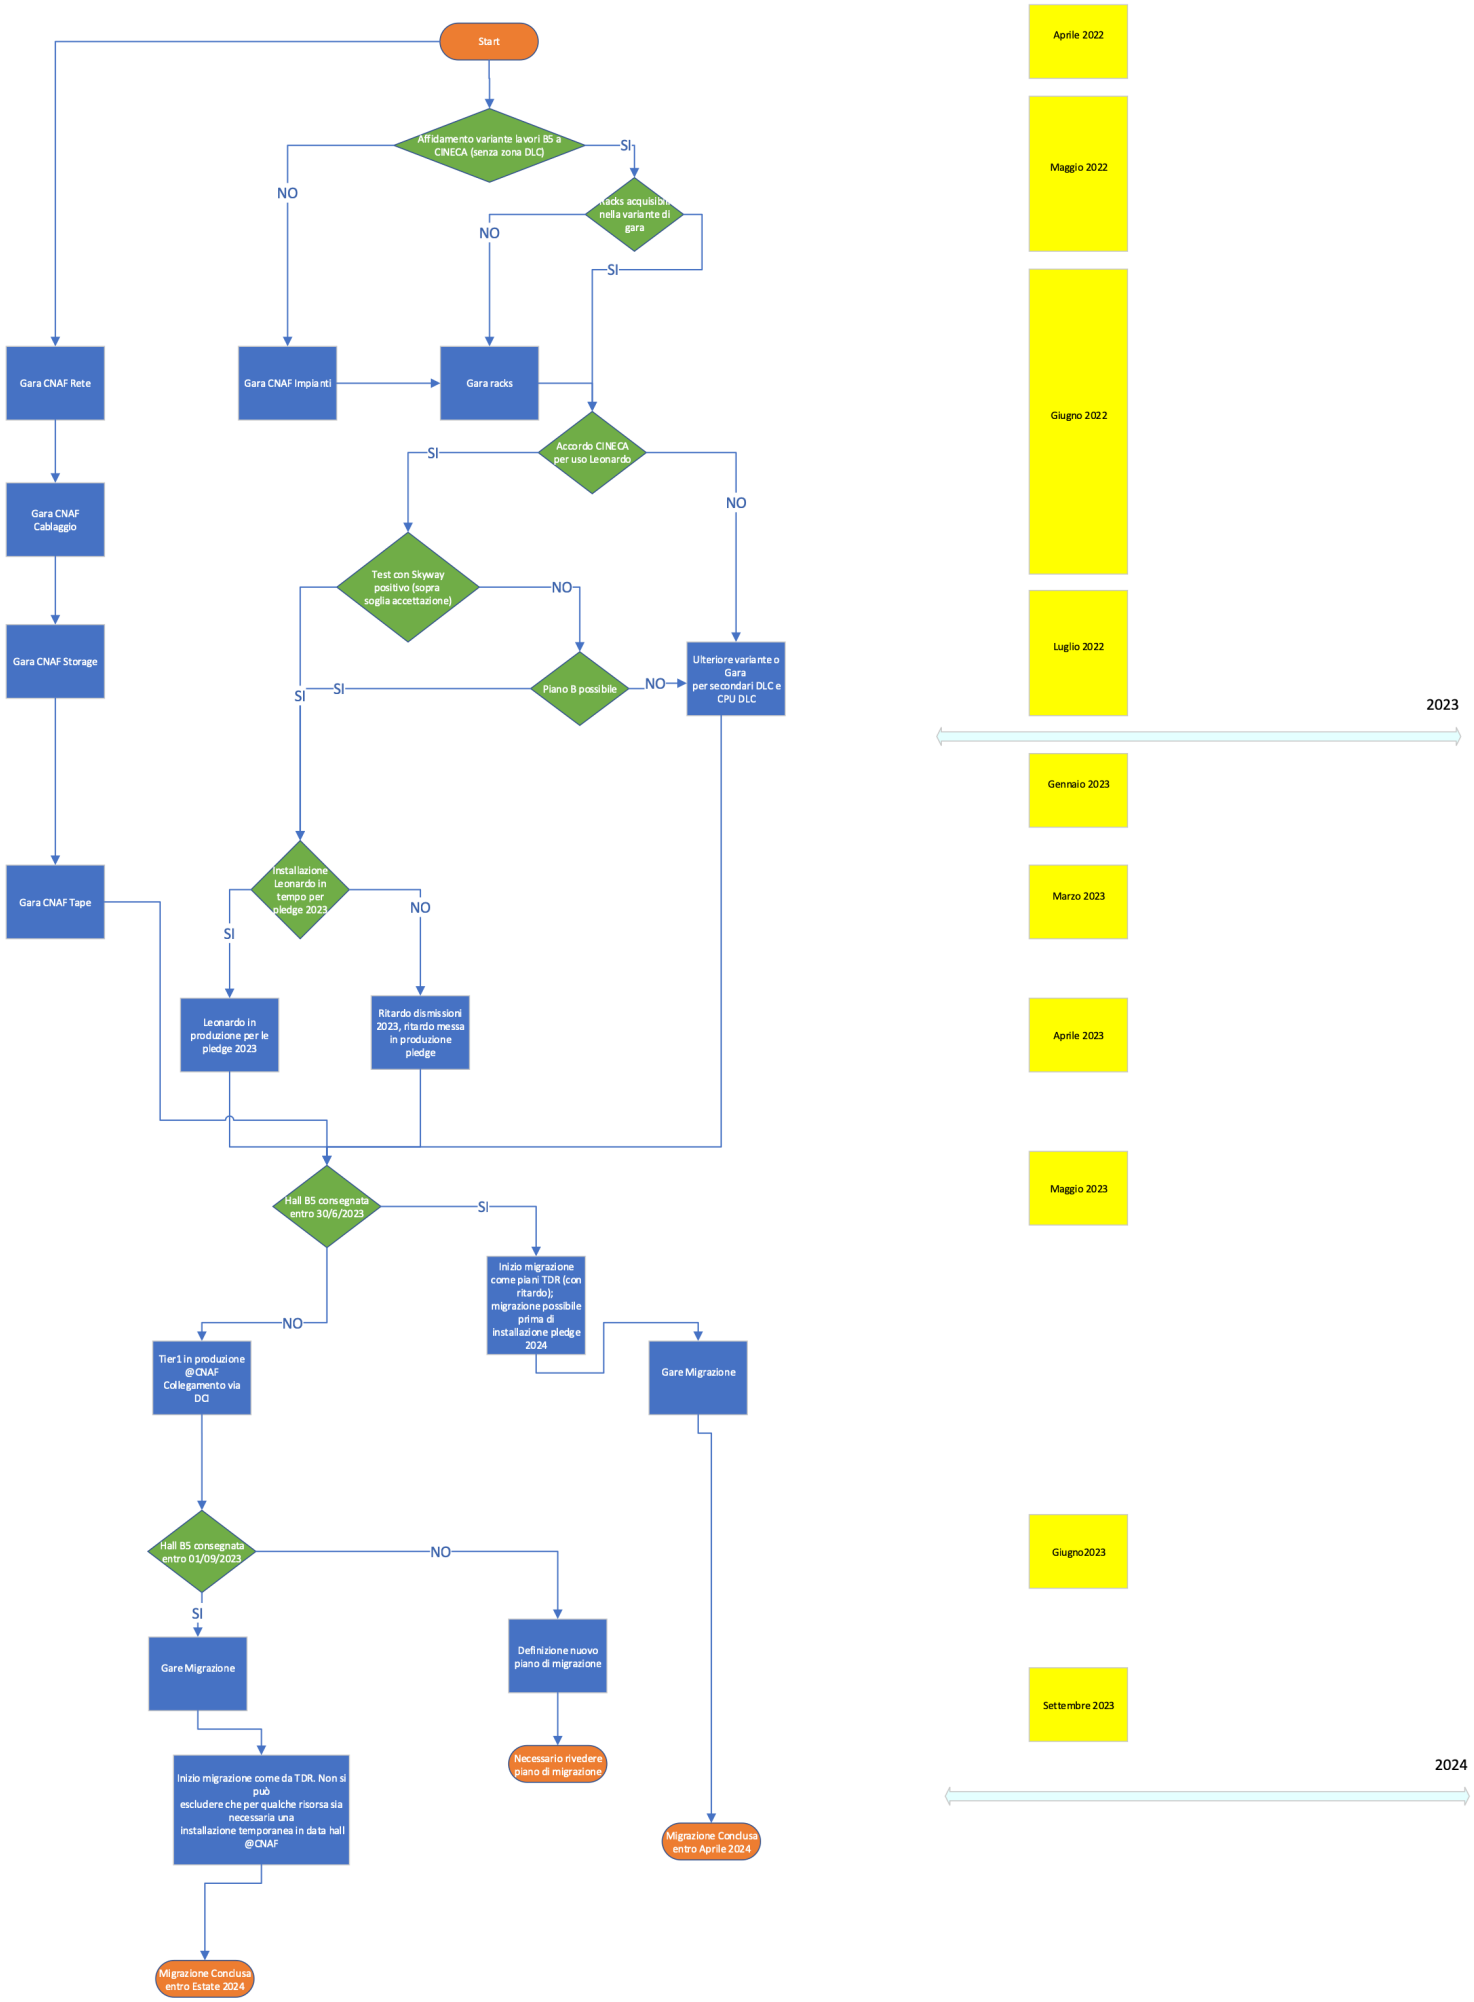
Start
Affidamento variante lavori B5 a CINECA (senza zona DLC)
SI
NO
racks acquisibili nella variante di gara
NO
SI
Gara CNAF Rete
Gara CNAF Impianti
Gara racks
Accordo CINECA per uso Leonardo
SI
NO
Gara CNAF Cablaggio
Test con Skyway positivo (sopra soglia accettazione)
NO
Gara CNAF Storage
Piano B possibile
NO
Ulteriore variante o Gara per secondari DLC e CPU DLC
SI
SI
Installazione Leonardo in tempo per pledge 2023
Gara CNAF Tape
SI
NO
Leonardo in produzione per le pledge 2023
Ritardo dismissioni 2023, ritardo messa in produzione pledge
Hall B5 consegnata entro 30/6/2023
SI
Inizio migrazione come piani TDR (con ritardo); migrazione possibile prima di installazione pledge 2024
NO
Tier1 in produzione @CNAF Collegamento via DCI
Gare Migrazione
Hall B5 consegnata entro 01/09/2023
NO
SI
Gare Migrazione
Definizione nuovo piano di migrazione
Necessario rivedere piano di migrazione
Inizio migrazione come da TDR. Non si può escludere che per qualche risorsa sia necessaria una installazione temporanea in data hall @CNAF
Migrazione Conclusa entro Aprile 2024
Migrazione Conclusa entro Estate 2024
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
2023
Gennaio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno2023
Settembre 2023
2024
