		Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		Preparazione dorsale su singola bobina	4 giorni	07/01/15 8.00	12/01/15 17.00		La Rosa;Miraglia;Pulvirenti
2		Pesatura torre	0,3 giorni	13/01/15 8.00	13/01/15 10.24		D'Amato;Grmek
3		Passaggio della dorsale dalla prima alla seconda bobina	0,3 giorni	13/01/15 8.00	13/01/15 10.24		D'Amato;Grmek;Miraglia
4		Rimozione piani dalla zavorra	1 giorno	15/01/15 8.00	15/01/15 17.00		D'Amato;Grmek
5		**Integrazione moduli di piano**	**7 giorni**	**19/01/15 8.00**	**27/01/15 17.00**		
6		Misure di latenza	4 giorni	19/01/15 8.00	22/01/15 17.00		Ameli;Kulikovskiy;La Rosa;Ni...
7		Chiusura moduli	3 giorni	23/01/15 8.00	27/01/15 17.00	6	Cacopardo;Miraglia
8		**Integrazione moduli di base torre**	**9 giorni**	**09/01/15 8.00**	**21/01/15 17.00**		
9		**Integrazione manifold**	**5 giorni**	**15/01/15 8.00**	**21/01/15 17.00**		
10		Installazione connettori	1 giorno	15/01/15 8.00	15/01/15 17.00		La Rosa;Miraglia
11		**Cablaggio interno**	**4 giorni**	**16/01/15 8.00**	**21/01/15 17.00**		
12		Cablaggio ottico	2 giorni	16/01/15 8.00	19/01/15 17.00	10	Pulvirenti;Viola
13		Cablaggio elettrico	2 giorni	20/01/15 8.00	21/01/15 17.00	12;22	Passaro
14		**Integrazione BEP**	**6,5 giorni**	**09/01/15 8.00**	**19/01/15 13.00**		
15		Installazione connettori	1 giorno	09/01/15 8.00	09/01/15 17.00		Cacopardo;Miraglia
16		Test	0,5 giorni	19/01/15 8.00	19/01/15 13.00	15	Ameli;Nicolau
17		**Integrazione BOP**	**3 giorni**	**16/01/15 8.00**	**20/01/15 17.00**		
18		Installazione connettori	1 giorno	16/01/15 8.00	16/01/15 17.00		Cacopardo;Miraglia
19		Cablaggio ottico	1 giorno	20/01/15 8.00	20/01/15 17.00	12	Pulvirenti;Viola
20		**Integrazione BPP**	**4 giorni**	**12/01/15 8.00**	**15/01/15 17.00**		
21		Installazione connettori	1 giorno	12/01/15 8.00	12/01/15 17.00		Cacopardo;Miraglia
22		Cablaggio elettrico	3 giorni	13/01/15 8.00	15/01/15 17.00	21	Passaro
23		Test moduli di base torre	0,167 giorni?	22/01/15 8.00	22/01/15 9.20	8	Ameli;Cocimano;Nicolau;Orl...
24		Intallazione moduli di base torre	1 giorno	22/01/15 9.20	23/01/15 9.20	23	Cacopardo;D'Amato;Grmek;...
25		**Posizionamento piani sulla zavorra**	**5,5 giorni**	**28/01/15 8.00**	**04/02/15 13.00**	**24**	
26		Posizionamento piani 1-4	1,5 giorni	28/01/15 8.00	29/01/15 13.00	5	D'Amato;Grmek;La Rosa;Mir...
27		Posizionamento piani 5-7	0,75 giorni	29/01/15 13.00	30/01/15 10.00	26	D'Amato;Grmek;La Rosa;Mir...
28		Posizionamento piani 8-10	0,75 giorni	30/01/15 10.00	30/01/15 17.00	27	D'Amato;Grmek;La Rosa;Mir...
29		Posizionamento piani 11-14	1,5 giorni	02/02/15 8.00	03/02/15 13.00	28	D'Amato;Grmek;La Rosa;Mir...
30		Posizionamento boa e regolazione sganciatori	1 giorno	03/02/15 13.00	04/02/15 13.00	29	D'Amato;Grmek

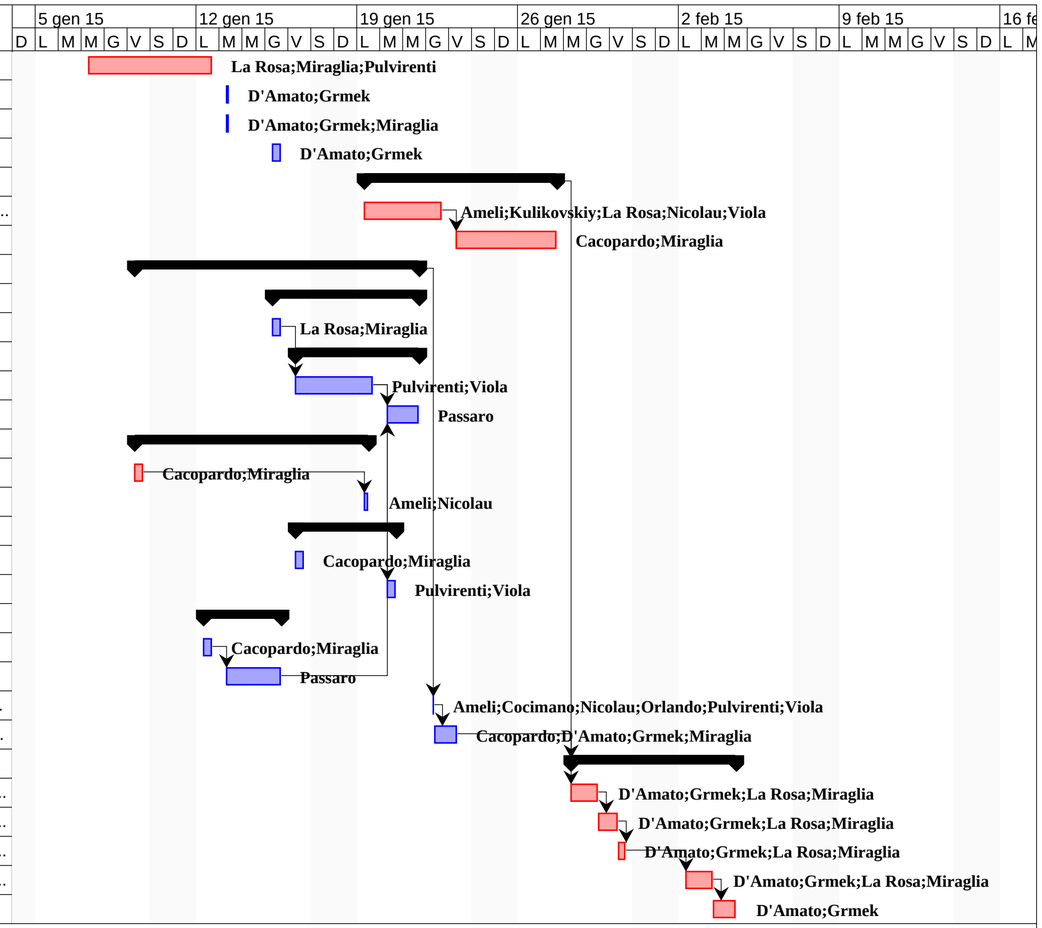

eb 15						23 feb 15						2 mar 15				
M	G	V	S	D		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
