



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



KM3NeT4RR

Annual meeting

23/11/2023 – Catania, INFN – LNS
Veronica Valsecchi (INFN)
Responsabile WP1

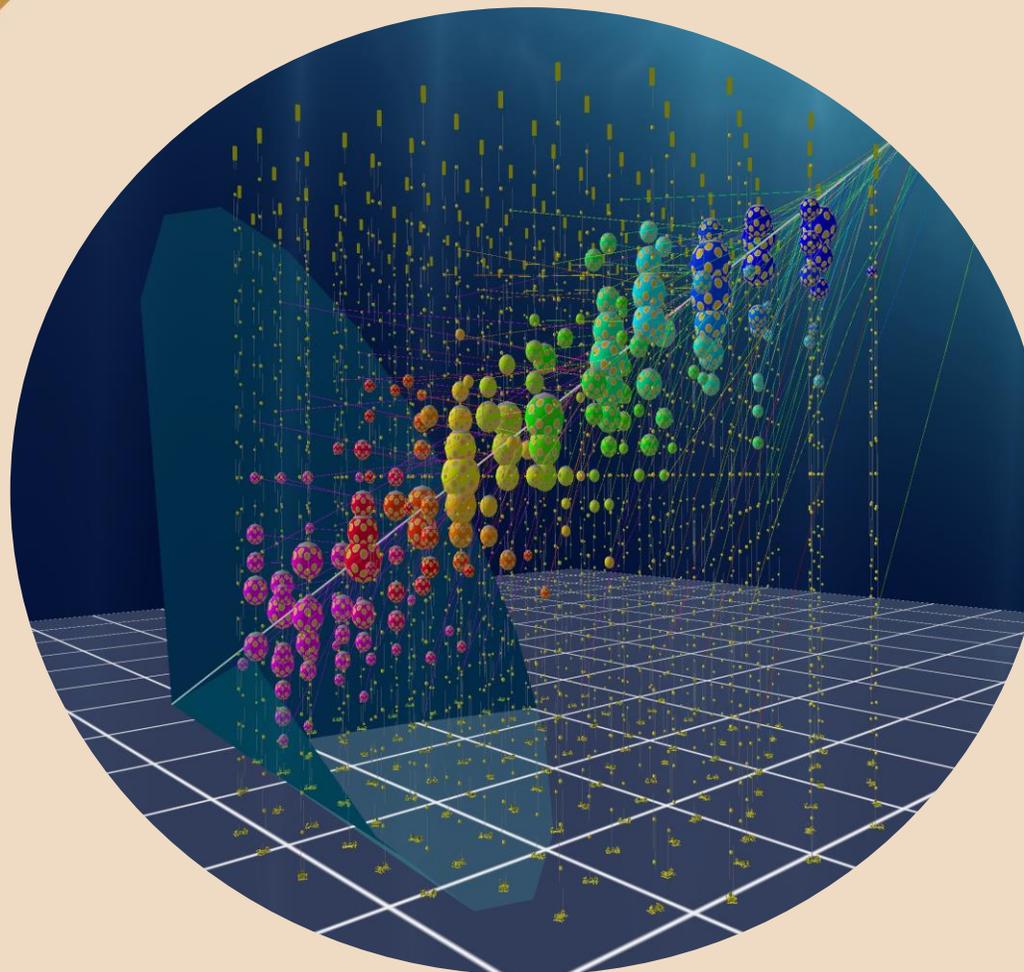

Work Package 1 – Project Management

Goal: the project management and overall activities coordination:

- technical, administrative and financial coordination of the project;
- project planning and execution control; decision-making processes support; conflicts and risks evaluation and identification of necessary corrective actions; compliance with NRRP; Intermediate Objectives monitoring as well as related indicators, monitoring and measuring outputs and impacts;
- relations with the MUR, to which results and periodical reports on physical and financial progress must be presented, ensuring continuous, flawless and transparent communication

Work Package 1 – Project Management

- Project Management Plan
- Models and tools for the management and realisation of the project documentation
- Risk management methodologies
- Financial reporting template
- Financial reporting template
- Monitoring reporting
- Indicator analysis
- Intermediate Objectives monitoring
- Legal and ethical standard analysis
- NRRP compliance

FOCUS avanzamento fisico

In cosa consiste?

- Monitoraggio nel progresso nella realizzazione del progetto nel periodo di riferimento, e il suo stato complessivo di esecuzione.

Cosa riguarda?

Work Package, Attività, Obiettivi intermedi, Deliverables, Indicatori di avanzamento

Dove si fa? E ogni quanto?

Si compila sulla piattaforma GEA ogni bimestre

Chi lo fa?

Il soggetto proponente (INFN) per tutti i soggetti coinvolti, dopo avere raccolto le informazioni da WP Leader e U.O. Particolarmente importante dunque la raccolta delle informazioni.

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

Sezione 1 - Andamento generale del progetto

L'utente inserisce informazioni inerenti al rispetto all'avanzamento generale di progetto previsto (se ci sono o meno degli scostamenti che producono alterazione del profilo scientifico di progetto) e al rispetto delle condizionalità/requisiti previste/i da PNRR ed applicabili, in particolare:

- contributo all'indicatore comune RRFCl 08 "N. Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno" (donne; uomini; non-binario) con aggiornamento su base semestrale a partire da una baseline (valore programmato);
- contributo ai tagging ambientali e digitali, pari opportunità, generazionali e di genere, informazione e pubblicità, principi Open science e FAIR Data;
- pertinenza delle attività al campo d'intervento 055 (previsto dall'Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021);

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

Sezione 2 - Avanzamento Work Package e Attività - L'utente, in base alle informazioni fornitegli dai WP Leader e dalle Unità Operative coinvolte nelle attività in corso per quel WP, inserisce gli aggiornamenti di riepilogo per ogni WP e per ogni Attività in corso nel bimestre. Laddove un WP non procedesse secondo quanto previsto, sarà necessario evidenziare le difficoltà emerse, come esse impattano il progetto e quali sono le possibili soluzioni proposte

Le domande sono formulate tipicamente con tre possibili risposte e con uno spazio per la descrizione.

Le risposte già previste sono

- Sì, non si segnalano ritardi nel raggiungimento;
- Sì, seppur con alcune variazioni già comunicate e che tuttavia non compromettono il successo del progetto;
- No, sono presenti delle criticità che non possono essere corrette con le variazioni consentite

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

SI RIPETE PER OGNI WP

SEZIONE 2 – AVANZAMENTO WORK PACKAGE E ATTIVITÀ - RIEPILOGO WP

WP: _____ BIMESTRE: _____

Il Work Package procede come previsto in merito alle tempistiche per il raggiungimento degli Obiettivi Intermedi, incluse le eventuali variazioni presentate?

Inserire una delle tre alternative disponibili:

In caso di selezione dell'opzione c) fornire una dettagliata descrizione delle criticità in corso, indicandone la natura e le possibili soluzioni per garantire il successo del progetto nelle tempistiche previste:

Inserire descrizione

SI RIPETE PER OGNI ATTIVITA' INIZIATA IN UN WP

SEZIONE 2 – AVANZAMENTO WORK PACKAGE E ATTIVITÀ - RIEPILOGO ATTIVITA'

U.O. _____ BIMESTRE: _____ ATTIVITA' _____ Numero _____ Inserire titolo attività _____

L'attività ha subito modifiche rilevanti rispetto alle previsioni sui contenuti tecnico scientifici previsti?

Inserire una delle tre alternative disponibili:

In caso di selezione dell'opzione c) fornire un'ampia e dettagliata motivazione, indicando possibili soluzioni:

Inserire descrizione

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

Sezione 3 – Avanzamento Obiettivi intermedi - L'utente inserisce informazioni relative all'avanzamento dei singoli Obiettivi Intermedi conclusi nel periodo. Si fornisce l'aggiornamento sull'esecuzione (incluse eventuali criticità) e la valorizzazione/aggiornamento degli indicatori oggettivi previsti nel progetto. Se Obiettivi intermedi dei bimestri precedenti non erano stati raggiunti a causa di criticità, il sistema propone la Sezione 3 anche relativamente a quegli obiettivi. Nel caso in cui nel bimestre corrente non siano presenti Obiettivi Intermedi, il sistema informatico GEA visualizzerà la dicitura “Nel bimestre corrente non è previsto il raggiungimento di alcun Obiettivo Intermedio per questo WP”.

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

SI RIPETE PER OGNI OBIETTIVO INTERMEDIO CONCLUSO nel periodo

SEZIONE 3 – AVANZAMENTO OBIETTIVI INTERMEDI				
U.O.	BIMESTRE:	OBIETTIVO	Numero	Inserire titolo obiettivo intermedio
L'Obiettivo Intermedio è stato raggiunto come previsto?				
Inserire una delle quattro alternative disponibili: In caso di selezione dell'opzione d) fornire una dettagliata descrizione delle criticità in corso e delle azioni che sono state previste per garantire comunque il successo del progetto nelle tempistiche previste:				
Inserire descrizione				
Gli Indicatori oggettivi per misurare il raggiungimento degli Obiettivi Intermedi sono rimasti gli stessi?				
Inserire una delle due alternative disponibili: In caso di risposta negativa, descrivere gli indicatori di riferimento equivalenti utilizzati:				
Inserire descrizione				
Valorizzare gli indicatori oggettivi previsti:				
Inserire valorizzazione				
I Deliverables caricati sono conformi o equivalenti ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell'Obiettivo Intermedio				
Inserire una delle due alternative disponibili:				

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

PER OGNI OBIETTIVO INTERMEDIO NON RAGGIUNTO NEI BIMESTRI PRECEDENTI

SEZIONE 3 – AVANZAMENTO OBIETTIVI INTERMEDI IL CUI RAGGIUNGIMENTO ERA PREVISTO NEI BIMESTRI PRECEDENTI

U.O.	BIMESTRE:	OBIETTIVO	Numero	Inserire titolo obiettivo intermedio
------	-----------	-----------	--------	--------------------------------------

L'Obiettivo Intermedio è stato raggiunto?

In caso di selezione dell'opzione d) fornire una dettagliata descrizione delle criticità in corso e delle azioni che sono state previste per garantire comunque il successo del progetto nelle tempistiche previste:

Inserire descrizione

Gli Indicatori oggettivi per misurare il raggiungimento degli Obiettivi Intermedi sono rimasti gli stessi?

Inserire una delle due alternative disponibili:

In caso di risposta negativa, descrivere gli indicatori di riferimento equivalenti utilizzati:

Inserire descrizione

Valorizzare gli indicatori oggettivi previsti:

Inserire valorizzazione

I Deliverables caricati sono conformi o equivalenti ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell'Obiettivo Intermedio

Inserire una delle due alternative disponibili:

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

Sezione 4 – Analisi previsionale e commenti finali – L'utente descrive lo scenario di previsione dell'evoluzione del progetto anche anticipando eventuali criticità future, e inserisce i commenti conclusivi.

SEZIONE 4 - ANALISI PREVISIONALE E COMMENTI FINALI				
	BIMESTRE:			
Scenario di previsione dell'evoluzione del progetto e commenti conclusivi				
1) Analisi previsionale - (Descrivere lo scenario di previsione della evoluzione del progetto, anticipando eventuali variazioni che si ritiene di dover richiedere nel bimestre successivo a quello in rendiconto, laddove ritenuto opportuno)				
Inserire descrizione				
2) Commenti finali				
Inserire descrizione				

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

La relazione tecnica viene compilata dal Soggetto Proponente (coordinatore) attraverso il sistema informatico “GEA”. Una volta conclusa la relazione, questa deve essere scaricata, firmata dal legale rappresentante del Soggetto Proponente (coordinatore) e ricaricata sulla piattaforma.

In base alla FAQ 2.6 del MUR riportata di seguito,

“Domanda: I campi di testo previsti nell’avanzamento fisico e nelle variazioni di progetto della piattaforma GEA dovranno essere compilati in lingua italiana o in lingua inglese?”

Risposta: In coerenza con l’articolo 9, comma 9, dell’Avviso, che poneva l’obbligo di produrre in lingua inglese la documentazione necessaria ai fini dell’ammissibilità della proposta progettuale, i campi di testo previsti nell’avanzamento fisico e nelle variazioni di progetto della piattaforma GEA dovranno essere compilati in lingua inglese” si suggerisce di redigere la relazione tecnica in inglese così come i deliverables previsti nel periodo di riferimento della relazione.

FOCUS avanzamento fisico: la relazione tecnica (allegata alle linee guida di rendicontazione)

I deliverables

Per la redazione dei deliverables il modello è quello previsto dal MUR e non prevede particolari prescrizioni in termini di lunghezza; I deliverables sono da caricare nella sezione “Allegati” su GEA (sezione conclusiva, tutti i documenti relativi al bimestre sono da caricare in questa sezione).

Anche i deliverables vengono caricati sul portale unicamente dal soggetto proponente quindi vanno raccolti da parte di WP e UO

FOCUS avanzamento fisico: ci sono altri adempimenti?

Sì...

- Dichiarazione DNSH (il soggetto proponente firma ed invia per tutti su GEA. Chiederemo a ciascun soggetto la propria dichiarazione in base alla quale possiamo compilare la Dichiarazione per tutti)
- Checklist DNSH solo per attività concluse e che ricadono in una delle aree interessate da DNSH
